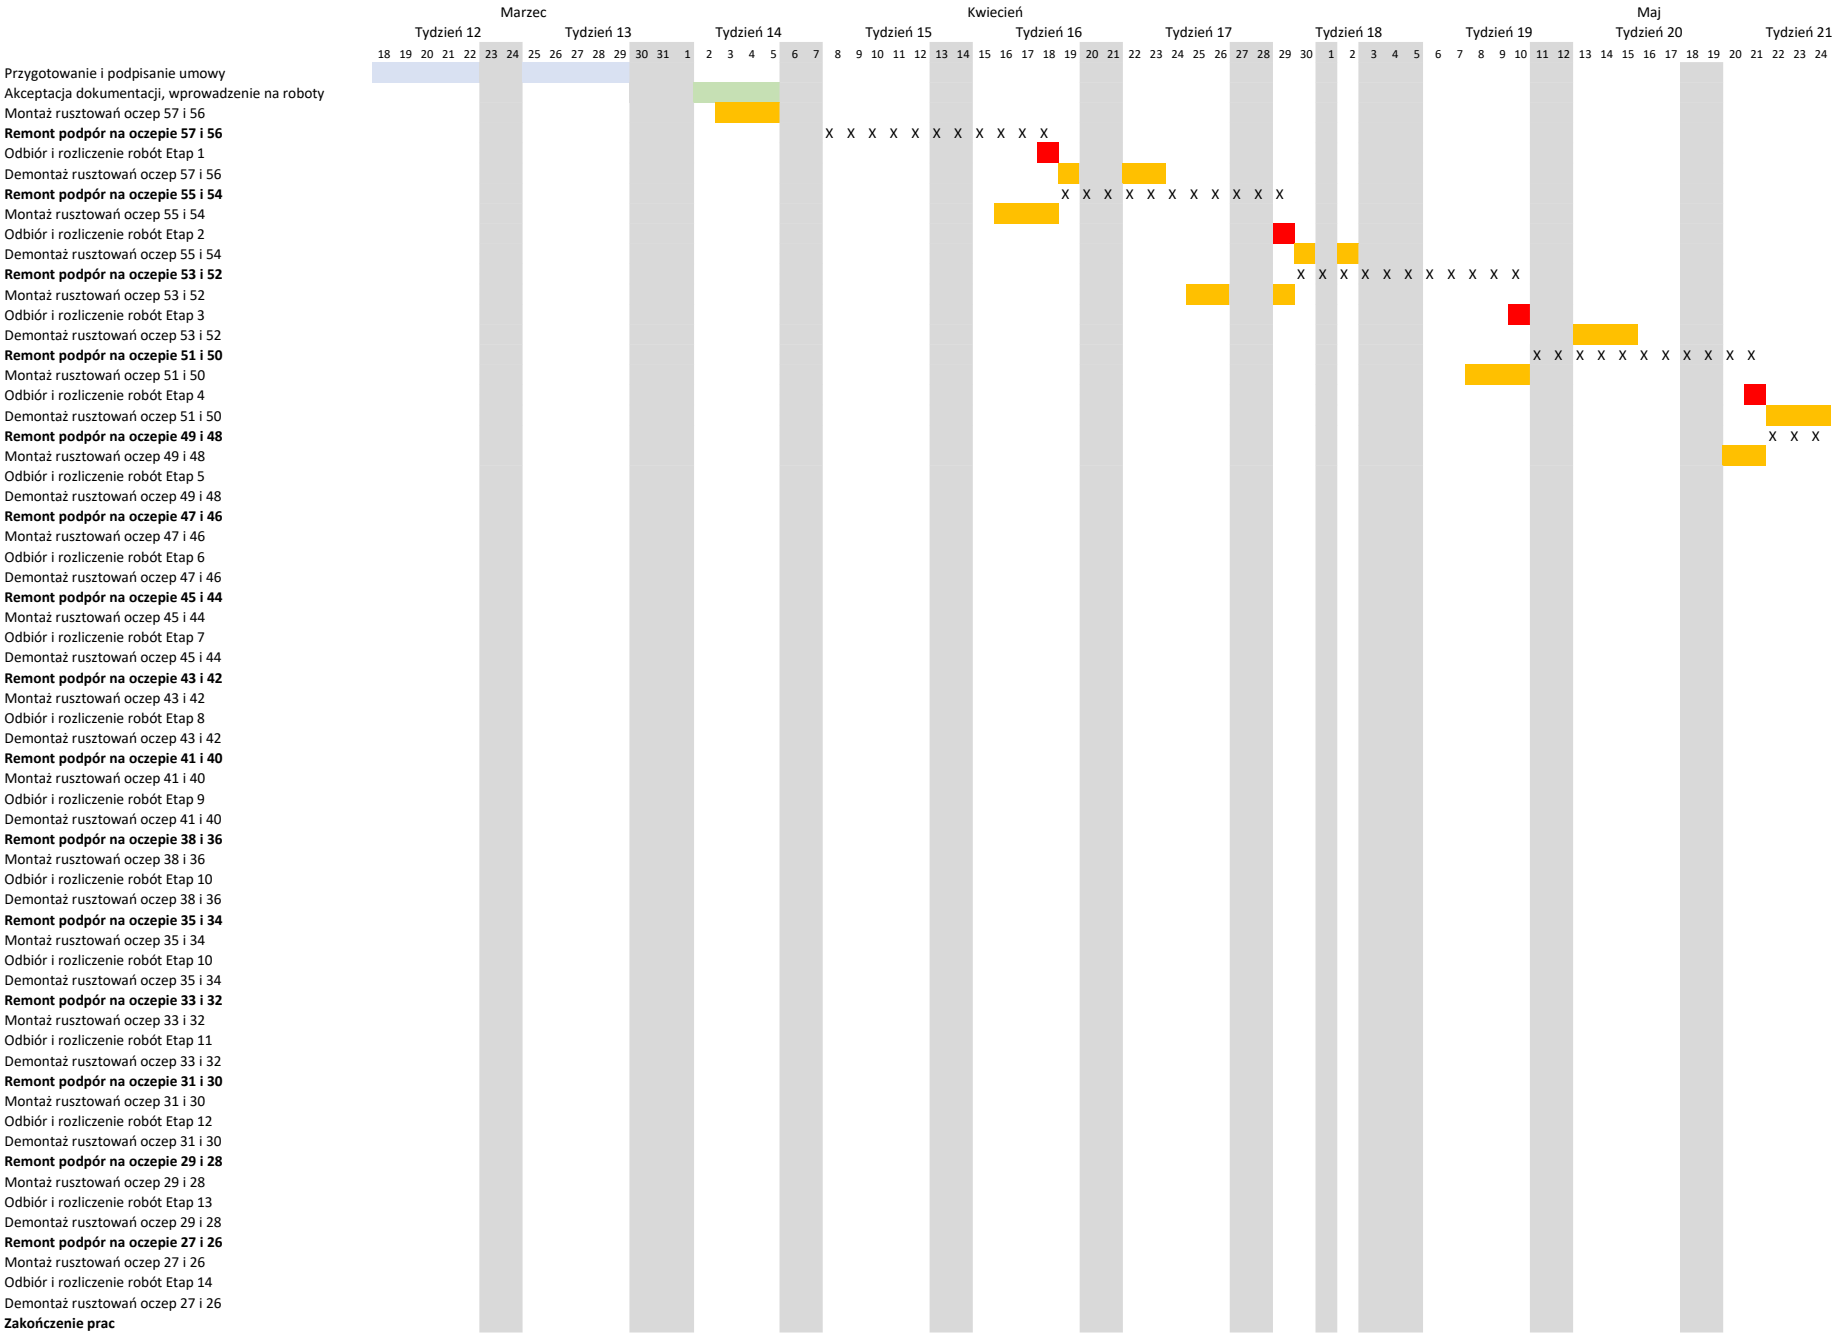
Marzec
Kwiecień
Maj
Tydzień 12
Tydzień 13
Tydzień 14
Tydzień 15
Tydzień 16
Tydzień 17
Tydzień 18
Tydzień 19
Tydzień 20
Tydzień 21
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Przygotowanie i podpisanie umowy
Akceptacja dokumentacji, wprowadzenie na roboty
Montaż rusztowań oczep 57 i 56
Remont podpór na oczepie 57 i 56
Odbiór i rozliczenie robót Etap 1
Demontaż rusztowań oczep 57 i 56
Remont podpór na oczepie 55 i 54
Montaż rusztowań oczep 55 i 54
Odbiór i rozliczenie robót Etap 2
Demontaż rusztowań oczep 55 i 54
Remont podpór na oczepie 53 i 52
Montaż rusztowań oczep 53 i 52
Odbiór i rozliczenie robót Etap 3
Demontaż rusztowań oczep 53 i 52
Remont podpór na oczepie 51 i 50
Montaż rusztowań oczep 51 i 50
Odbiór i rozliczenie robót Etap 4
Demontaż rusztowań oczep 51 i 50
Remont podpór na oczepie 49 i 48
Montaż rusztowań oczep 49 i 48
Odbiór i rozliczenie robót Etap 5
Demontaż rusztowań oczep 49 i 48
Remont podpór na oczepie 47 i 46
Montaż rusztowań oczep 47 i 46
Odbiór i rozliczenie robót Etap 6
Demontaż rusztowań oczep 47 i 46
Remont podpór na oczepie 45 i 44
Montaż rusztowań oczep 45 i 44
Odbiór i rozliczenie robót Etap 7
Demontaż rusztowań oczep 45 i 44
Remont podpór na oczepie 43 i 42
Montaż rusztowań oczep 43 i 42
Odbiór i rozliczenie robót Etap 8
Demontaż rusztowań oczep 43 i 42
Remont podpór na oczepie 41 i 40
Montaż rusztowań oczep 41 i 40
Odbiór i rozliczenie robót Etap 9
Demontaż rusztowań oczep 41 i 40
Remont podpór na oczepie 38 i 36
Montaż rusztowań oczep 38 i 36
Odbiór i rozliczenie robót Etap 10
Demontaż rusztowań oczep 38 i 36
Remont podpór na oczepie 35 i 34
Montaż rusztowań oczep 35 i 34
Odbiór i rozliczenie robót Etap 10
Demontaż rusztowań oczep 35 i 34
Remont podpór na oczepie 33 i 32
Montaż rusztowań oczep 33 i 32
Odbiór i rozliczenie robót Etap 11
Demontaż rusztowań oczep 33 i 32
Remont podpór na oczepie 31 i 30
Montaż rusztowań oczep 31 i 30
Odbiór i rozliczenie robót Etap 12
Demontaż rusztowań oczep 31 i 30
Remont podpór na oczepie 29 i 28
Montaż rusztowań oczep 29 i 28
Odbiór i rozliczenie robót Etap 13
Demontaż rusztowań oczep 29 i 28
Remont podpór na oczepie 27 i 26
Montaż rusztowań oczep 27 i 26
Odbiór i rozliczenie robót Etap 14
Demontaż rusztowań oczep 27 i 26
Zakończenie prac

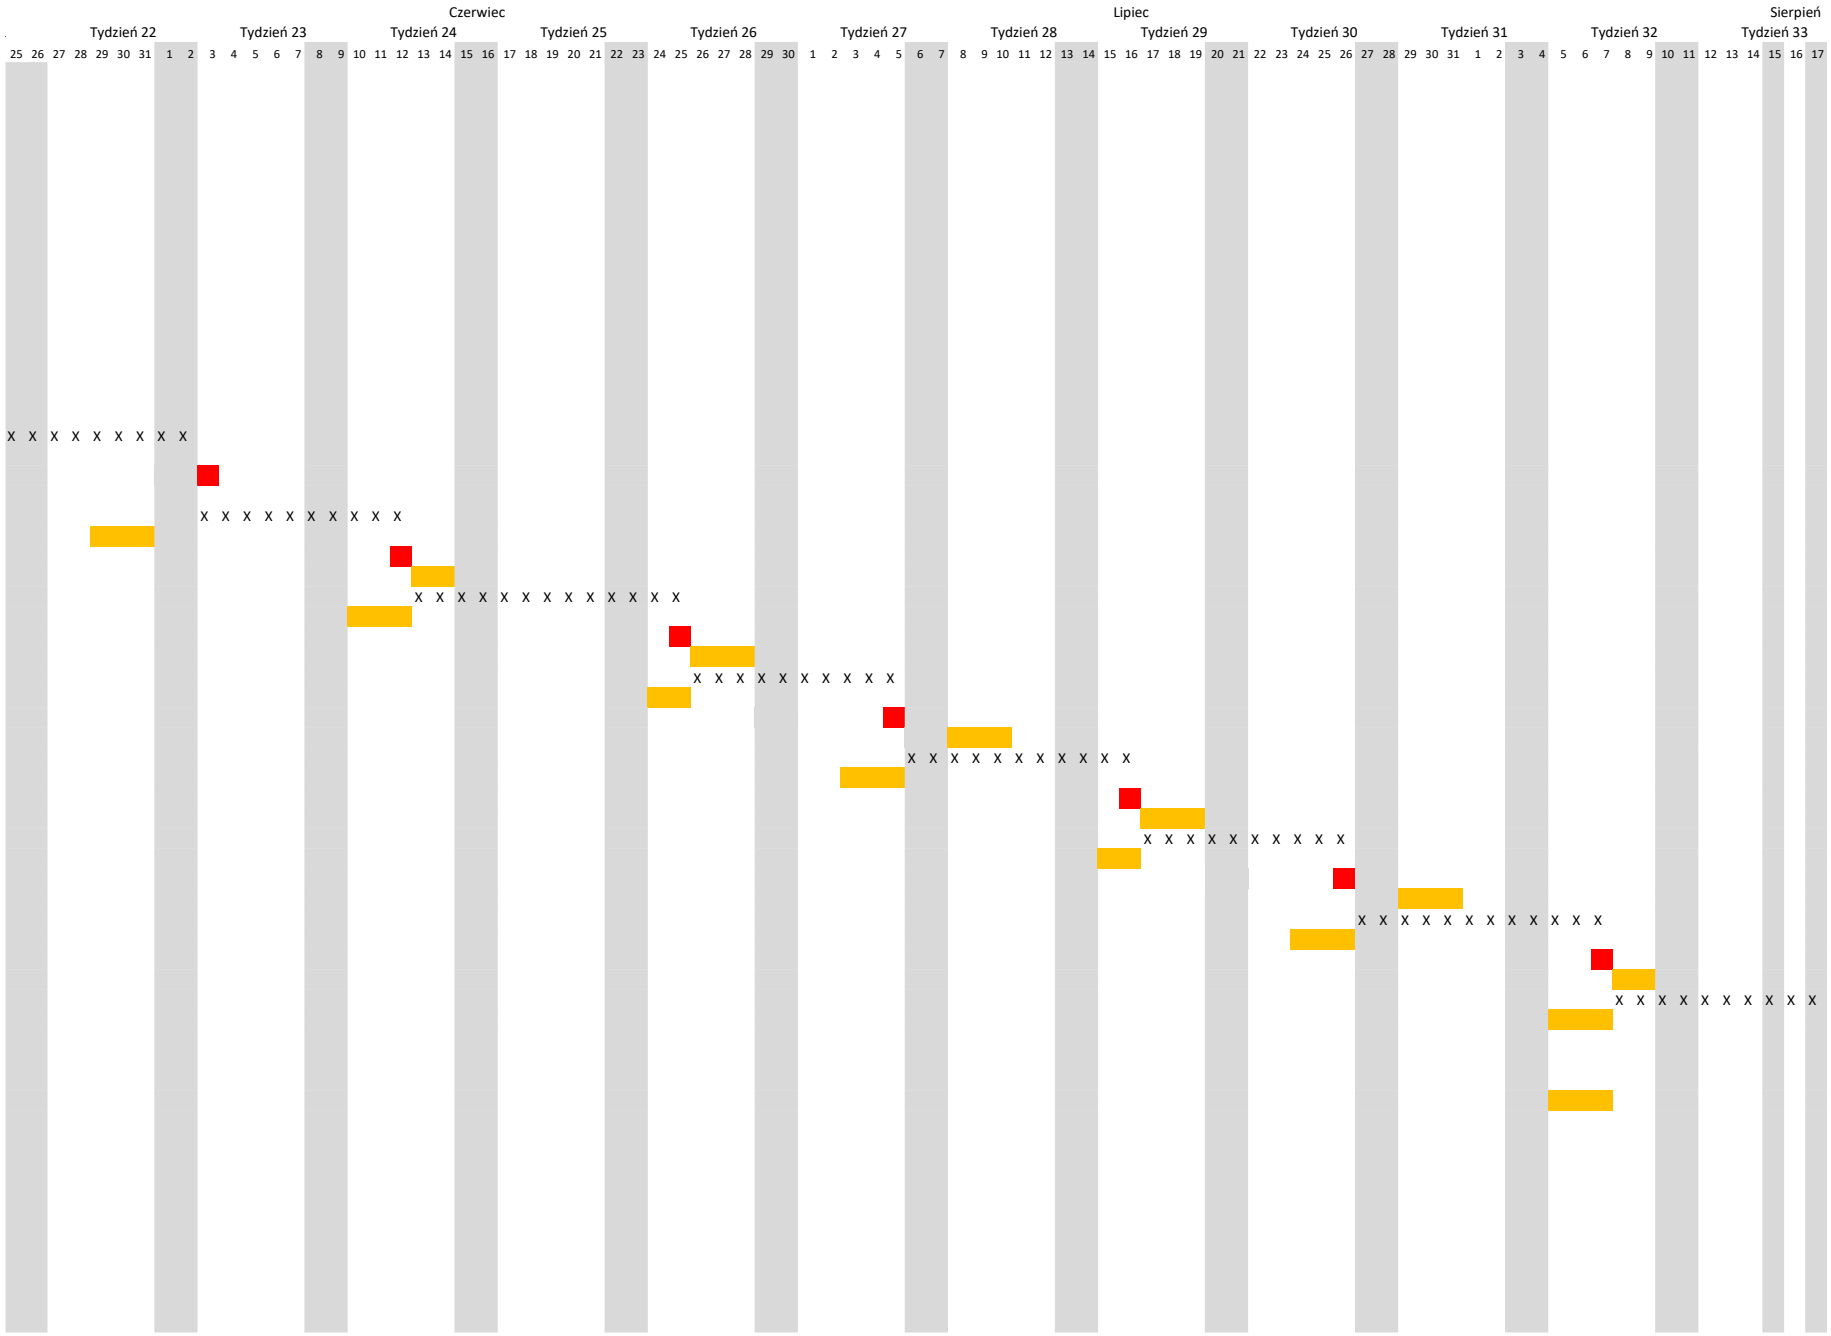
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Tydzień 22
Tydzień 23
Tydzień 24
Tydzień 25
Tydzień 26
Tydzień 27
Tydzień 28
Tydzień 29
Tydzień 30
Tydzień 31
Tydzień 32
Tydzień 33
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

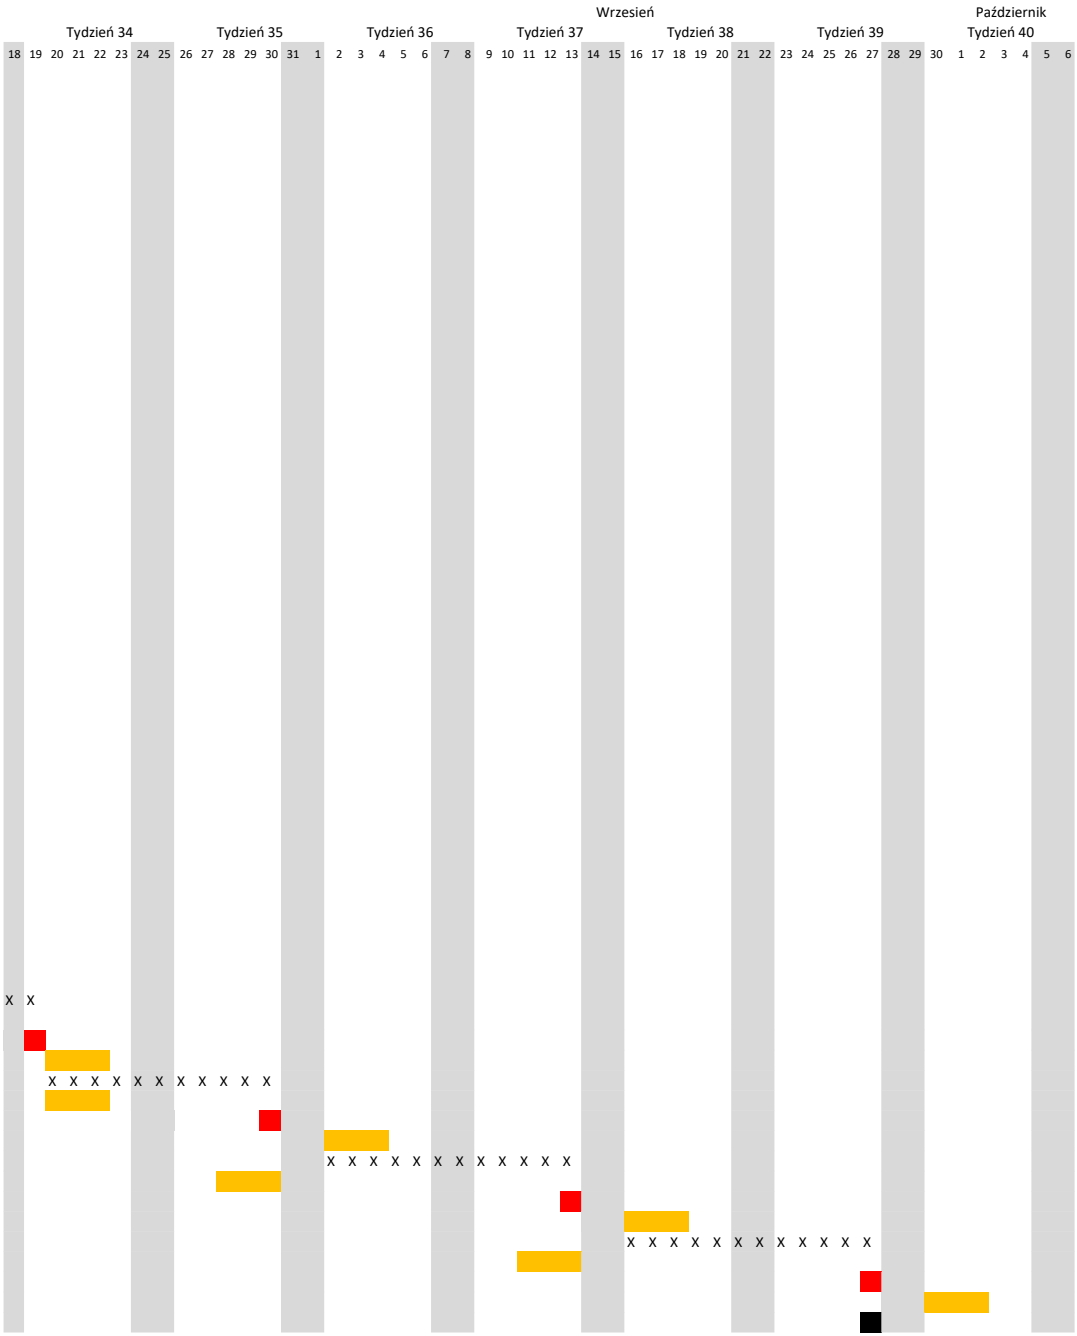
Wrzesień
Październik
Tydzień 34
Tydzień 35
Tydzień 36
Tydzień 37
Tydzień 38
Tydzień 39
Tydzień 40
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
